

Ваши документы начинают работать на вас



Визуализация концепции

Сначала факт. Потом —
минимально достаточный
контур.

Заказчик: _____

Ценовой снимок · 09.09.2026

Сначала разберём одну дорогую рутину

У компании уже есть люди, документы и рабочие системы. Проблема не в нехватке ещё одного чата, а в часах на поиск нужной версии, перенос данных, сверку и первый черновик.

Начинаем с одного выбранного процесса. Помощник работает с разрешёнными источниками, показывает основания ответа и готовит результат к проверке; решение, подпись, отправка, платёж и профессиональная ответственность остаются у сотрудников.

Первый шаг	Что получает компания
Процесс	Карта потерь времени и качества; перечень допустимых данных и ответственных
Проверка	Выборка реальных задач; критерии успеха и повод остановить пилот
Решение	Предварительный вариант размещения и бюджетный коридор

Сначала измерим пользу. Затем решим: локальный сервер, облачный режим или остановка проекта.

Рекомендация · 90-минутная диагностика с владельцем процесса, ИТ и — для чувствительных данных — ИБ/правом.

Источники · E1 — продуктовый контекст Format43; ценовой снимок на 09.09.2026

РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Что изменится на следующий день после запуска

Сотрудник не начинает с пустого листа. Он задаёт вопрос, загружает разрешённый документ или получает входящую задачу; система разбирает текст, скан, встречу или фото и готовит проверяемый черновик.

Функция	Проверяемый результат	Решение остаётся у
Руководитель	Утренний бриф, подготовка к встрече, решения и просроченные поручения	Руководителя
Секретарь	Протокол, ответственные и сроки после совещания	Владельца встречи
Закупки	Единая таблица из КП: пропуска, НДС, валюта, сроки	Уполномоченного закупщика
Юристы · бухгалтерия	Разбор договора, цитаты, проект правок; первичка, реквизиты, исключения	Юриста · бухгалтера
ПТО · строительство	Поиск по ПД/РД, черновик ППР, комплектность, сметные расхождения	Инженера · ГИП
УК · логистика	Категория обращения и проект ответа; карточка рейса, ТО, OEM, претензии, тендеры	Диспетчера · механика
Маркетинг	Варианты постов, структура презентации, текст страницы и изображения из утверждённых фактов	Команды бренда
Рекомендация · для пилота выбрать 1–3 задачи с общей проверяемой ценностью. Целевой эффект согласовать только после замера времени и ошибок; отраслевые проценты не превращать в обещание.		

Источники · E1 — JTBD и роли; E3 — приоритетные сценарии · все эффекты маркируются как цель пилота

Не одна «всемогущая» модель, а пять понятных видов работы

Инструмент	Работа
Qwen	Текст, вопросы, сравнение и объяснение
OCR	Сканы, таблицы и документы плохого качества
Речевая модель	Расшифровка встречи или звонка и проект протокола
Визуальная модель	Фото, шильдики и чертежи
Генератор изображений	Маркетинговые варианты; не доказательство инженерного или юридического факта



Визуализация концепции

Сотрудник видит один интерфейс. Под ним система проверяет пользователя, открывает только разрешённые источники, сохраняет ссылку на документ и отделяет черновик от действия. По умолчанию помощник читает и готовит. Перед изменением в рабочей системе человек видит будущий результат и подтверждает его; прямых полномочий на платёж, подпись, кадровое решение, инженерный допуск, управление техникой или публикацию модель не получает.

Факт · локальное размещение может сократить передачу данных третьим лицам, но само по себе не означает соблюдение 152-ФЗ. Нужны цели и основания обработки, карта данных, права, сроки, меры, документы и процедуры заказчика.

Источники · E2 — правовые и технические контроли; E4 — классы моделей · изображение является визуализацией

пилот до покупки

Сначала исходная цифра. Потом — решение об оборудовании

Для выбранного процесса фиксируем измеримую исходную точку и заранее определяем, кто вправе подтвердить результат.

Что фиксируем	Как проверяем
1 · Объём	Сколько случаев проходит за неделю или месяц
2 · Время	Сколько минут специалист тратит на один случай
3 · Ошибки	Возвраты и дефекты текущего процесса
4 · Проверка AI	Сколько времени остаётся на проверку результата
5 · Приёмка	Какие ответы приняты, исправлены или отклонены
6 · Контроли	Нарушения прав, выдуманные ссылки, пропущенные поля
7 · Экономика	Стоимость одного успешно завершённого случая

Выборка содержит реальные, но обезличенные или отдельно разрешённые примеры. Для каждого заранее известны ожидаемый результат и сотрудник, который может его подтвердить.

Параметр	Рабочая рекомендация
Выборка	50–200 примеров на сценарий
Ценность	2–4 недели на качество и пользу
Нагрузка	До 6–8 недель перед закупкой
Метрики	Время, качество и риск — согласуются на диагностике
Условие остановки · обязательная проверка человеком не экономит время; качество ниже согласованного уровня; найден критический дефект доступа или безопасности.	

Итог пилота — подписанное решение: остановиться, доработать сценарий, остаться в облаке или перейти в локальный режим.

Источники · E3 — дизайн проверочной выборки; E1 — критерии решения и stop condition

КОММЕРЧЕСКАЯ РАМКА

Четыре способа начать — после диагностики

Диапазоны ниже — коммерческие гипотезы v1, не публичный прайс и не оферта. Финальная сумма зависит от обследования, состава оборудования, лицензий, налогов, интеграций и SLA.

Вариант	Для кого	Что входит	Коридор · границы
Cloud PoV · проверка ценности	1–3 сценария до покупки оборудования	Диагностика; выборка; сравнение 2–3 моделей; прототип; замер качества, времени и стоимости; риски; расчёт local	250–700 тыс. Р · разрешённые, обезличенные или синтетические данные; без промышленной записи
Local Mini · локальный старт	10–50 активных пользователей; один офис	Узел; поиск; корпоративный вход; базовые права; журнал; backup; внедрение и обучение	0,9–2,5 млн Р · без высокой отказоустойчивости; согласованные окна обслуживания
Local Office · офисная система	30–150 пользователей; несколько подразделений; 3–8 сценариев	Разделение источников; согласования; резервирование; журнал ИБ; test/prod; проверка восстановления	2,5–8 млн Р · зависит от нагрузки, хранения, интеграций и доступности
GPU / Pro · высокая нагрузка	100–1000+ пользователей; тяжёлые фото, чертежи, обучение или HA	Состав после замера и проектирования	Цена после sizing · формулировка «от» без состава, резервирования и SLA не используется
Важная граница · 500 000 Р — лимит вычислительного оборудования, не полного проекта. Полный старт Base по модели — 627 894 Р. Оборудование, лицензии, внедрение и поддержка раскрываются отдельными строками.			


Как выбираем

Рекомендуемый вариант определяется после диагностики по подтверждённой нагрузке, режиму данных и числу сценариев. Для Pro цена появляется только после sizing.

Источники · E5 — модель поставки; E4 — hardware/TCO · гипотезы v1, не публичная оферта

Сценарий, а не обещание окупаемости

Формульная модель показывает, почему оборудование нельзя покупать по впечатлению от демо.

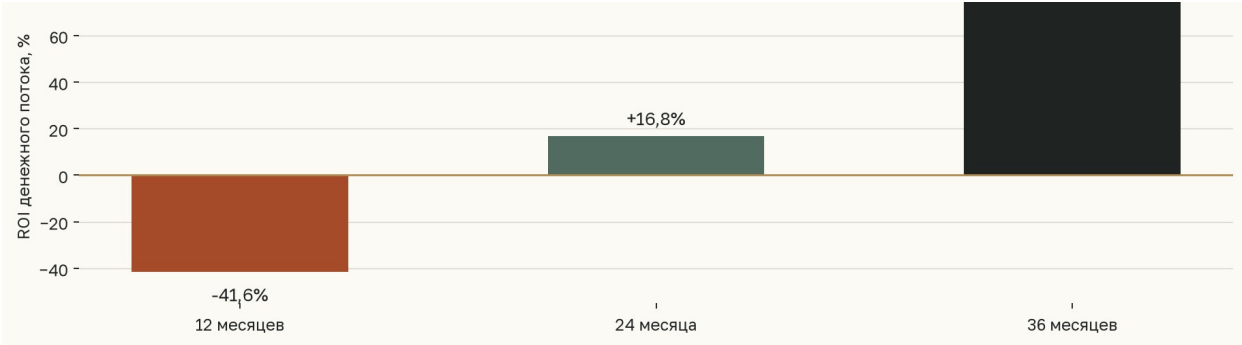

Внутренний расчёт Format43 · Base · data/roi-model.xlsx · снимок 09.09.2026

Показатель Base	Значение	Смысл
Полный старт	627 894 Р	Оборудование + UPS/NAS + монтаж + начальная интеграция
Локальные расходы	34 061 Р/мес.	Электричество, сопровождение, backup, простой, резерв, API
Облако/API	43 499 Р/мес.	Замещаемая альтернатива при 120 GPU-часах
Ценность труда	21 120 Р/мес.	Только реализуемая часть экономии времени
Чистый эффект	30 557 Р/мес.	Полная ценность минус локальные расходы
Payback	20,55 месяца	ROI: -41,6% / +16,8% / +75,2% на 12 / 24 / 36 мес.

Консервативный сценарий имеет отрицательный поток и не окупается. Возврат менее 12 месяцев появляется только в aggressive-сценарии с высокой подтверждённой загрузкой.

Что заменяем цифрами заказчика	Источник
Случаи/мес.; минуты/случай; полная стоимость часа	Отчёт процесса · хронометраж · финслужба
Цена простоя; облако/API; требуемая доступность	Владелец процесса · счета/лимиты · ИТ/бизнес
Расчёт · для возврата за 12 месяцев нужен чистый эффект 52 325 Р/мес.; разрыв — около 21 767 Р/мес. Поэтому годовую окупаемость не обещаем.	

Источник · E4 — пересчитанный roi-model.xlsx · Base payback 20,55 месяца; Avito verified: 0

90-ДНЕВНЫЙ ROLLOUT

В приёмку выходит один рабочий процесс — не «AI вообще»

Сроки — рабочая рекомендация. Они зависят от готовности документов, доступов, интеграций и решений ИБ/права.

Период	Работа	Результат / gate
Дни 1–15	Назначаем владельца; описываем шаги; фиксируем время и ошибки; определяем источники и права; собираем выборку; подписываем цель и повод остановиться	Паспорт пилота и допущенные данные
Дни 16–35	Сравниваем 2–3 модели; измеряем качество, скорость, стоимость и время проверки; разбираем ошибки, а не только лучшие примеры	Отчёт: работает / изменить / остановить
Дни 36–55	По фактической нагрузке выбираем cloud/local/hybrid; фиксируем оборудование, хранение, интеграции, остаточные риски и полную стоимость	Спецификация и решение о бюджете
Дни 56–75	Настраиваем вход, права, источники, бэкап, журнал и согласования; проверяем закрытые документы, вредные вложения, откат и восстановление	Допуск к ограниченному запуску или доработка
Дни 76–90	Обучаем пользователей; запускаем выбранный процесс; измеряем принятие результатов и время проверки; согласуем поддержку и следующий сценарий	Приёмка конкретного процесса

Ритм решений

Факт	Решение
Качество и ценность подтверждены	Продолжить и выбрать режим
Нагрузка не подтверждена	Остаться в облаке или изменить сценарий
Критический риск	Остановиться до устранения
Каждая фаза заканчивается результатом, владельцем и правом остановиться.	

Источник · E6 — 90-дневный план внедрения; E2 — проверка доступа, отката и восстановления

AI готовит. Квалифицированный сотрудник решает



Визуализация концепции

Заказчик	Format43	Совместно
• Назначает владельца и принимающих результат • Даёт законно используемые данные и описывает права • Подтверждает цели, основания и требования • Обеспечивает площадку, сеть, питание, ИТ/ИБ • Проверяет, подписывает и отправляет • Сообщает об изменениях	• Фиксирует границы и допущения • Собирает согласованный объём • Сравнивает модели на выборке • Настраивает права, журнал, backup и обновления • Проверяет качество, доступ и restore • Обучает и передаёт документацию • Поддерживает по подписанному SLA	• Карта данных и роли • Модель угроз и меры • Критерии приёмки и остаточные риски • Инциденты, удаление, восстановление • Решение о новом источнике или действии
Граница · Format43 не заменяет юриста, ИБ, главного бухгалтера, ГИП, механика, диспетчера или другого accountable professional заказчика.		

Источники · E2 — decision rights и human approval; E1 — роли заказчика/поставщика · визуализация концепции

ОГОВОРКИ

Что предложение не обещает

Не входит без отдельной строки

Данные и системы	Инфраструктура и обязательства
Очистка и ручная разметка большого архива	Миграция сети, каталогов пользователей или хранилищ
Изменение исходных систем и нестандартные коннекторы	Круглосуточная поддержка, резервная площадка, высокая отказоустойчивость
Права на сторонние данные, изображения, шрифты или закрытые модели	Сертификация, аттестация, юридическое заключение, режим коммерческой тайны
Автономные платежи, подпись, публикация или управление техникой	Иные необратимые действия без отдельного согласованного контура

Ключевые оговорки

Маркер	Формулировка
Факт	On-prem не означает автоматическое соблюдение 152-ФЗ
Факт	Модель может ошибаться; источники и проверка снижают риск, но не дают нулевой вероятности ошибки
Расчёт	Стоимость и ROI зависят от данных, загрузки, курса, оборудования, лицензий и поддержки
Цель пилота	Функциональные проценты — цели проверки, не гарантия результата
Рекомендация	Каждый новый сценарий, источник и действие проходят повторную оценку данных и риска
Рынок	Проверенных объявлений Avito: 0; б/у оборудование не включено как подтверждённая цена

Срок действия и уточнения

Это ценовой снимок на 09.09.2026. Публичные цены и сроки поставки проверяются перед счётом; итоговые обязательства возникают только из подписанного договора, технического задания, спецификации и SLA.

На диагностике уточняются данные, число пользователей, одновременная нагрузка, интеграции, допустимое время ответа, RPO/RTO, режим ПДн/тайны, применимость КИИ/ГИС/СКЗИ, площадка и ответственные.

Источники · E2 — правовые/ИБ-оговорки; E4 — рыночный снимок и ROI · v1, не публичная оферта

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

90 минут, после которых можно сказать «нет»



Визуализация концепции

Не начинайте с выбора видеокарты. Начните с процесса, где уже теряются часы, сроки или качество.

Принести на встречу	Получить за 90 минут
Один повторяемый процесс	Разложенный по шагам процесс
5–10 обезличенных примеров	Текущие потери времени
Владельца процесса, который знает цену задержки	Одну проверяемую задачу
ИТ-специалиста, который знает источники и доступы	Перечень допустимых данных
ИБ/право — если есть чувствительные данные	Меру успеха и повод остановиться
	Формат пилота и следующий бюджетный шаг
Назначить 90-минутную диагностику одного процесса	

Формулировка для письма

«Предлагаю не обсуждать AI в целом. Возьмём один процесс, 5–10 обезличенных примеров и за 90 минут решим, есть ли здесь измеримая задача. Если экономика или риск не сходятся, так и зафиксируем — до закупки оборудования».

Контакт	Следующее окно
Менеджер Format43	Согласуем в ответном письме

Источники · E1 — диагностический workshop и критерии решения · визуализация концепции
